



# 工事だより (1月号)



謹んで新春をお祝い申し上げます。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本工事も残すとこ3カ月となり、慌ただしくなっております。

新たな気持ちで仕事へ取り組み昨年同様に無事故・無怪我で頑張っております。

本年も皆様が御健勝で御多幸でありますよう、心からお祈り申し上げます。

1. 工事名 阿蘇管内治山激甚災害対策特別緊急事業第21号工事 他合併

2. 工事場所 熊本県南阿蘇村大字立野字三ツ石

施工業者: 緒方・土井建設工事共同企業体

TEL 0967-65-8460

現場代理人兼監理技術者 里形 吉章(緒方建設)

主任技術者 上田 健晴(土井組)

発注者: 熊本県 県北広域本部 阿蘇地域振興局 農林部 山地災害対策課

TEL 0967-22-3649

12月の実施作業 法枠工(組立・吹付)・土留工(床掘・型枠組立・生コン打設)



今月(1月)の作業内容 法枠工(組立・吹付)・土留工(床掘・型枠組立)



【法枠組立】  
金網設置完了後、鉄筋及び  
フレームを組立てる




【法枠吹付】  
法枠組立完了後にセメント・水・砂を  
ベースに練り混ぜホースで圧送し吹付ける。



## 亥(い/いのし)年の意味

猪の肉には不思議なことに、万病を予防するなどと言われております。すなわち、無病息災の象徴とされていますから【勇気と無病息災】の意味があります。無病息災の他には、【田の神・作物の神】などの意味合いもあるそうです。





法枠吹付及び土留工(生コン打設)の施工が進み現場の風景が変わってきて、近隣の方をはじめ通行される方々には、こんな工事をされているんだと、わかって頂けると幸いです。

1月7日現在の進捗

法枠吹付 A=3,200㎡/9,281㎡

土留工(生コン打設完了) 5基/10基  
(完了)No.6・No.7・No.8・No.9・No.10

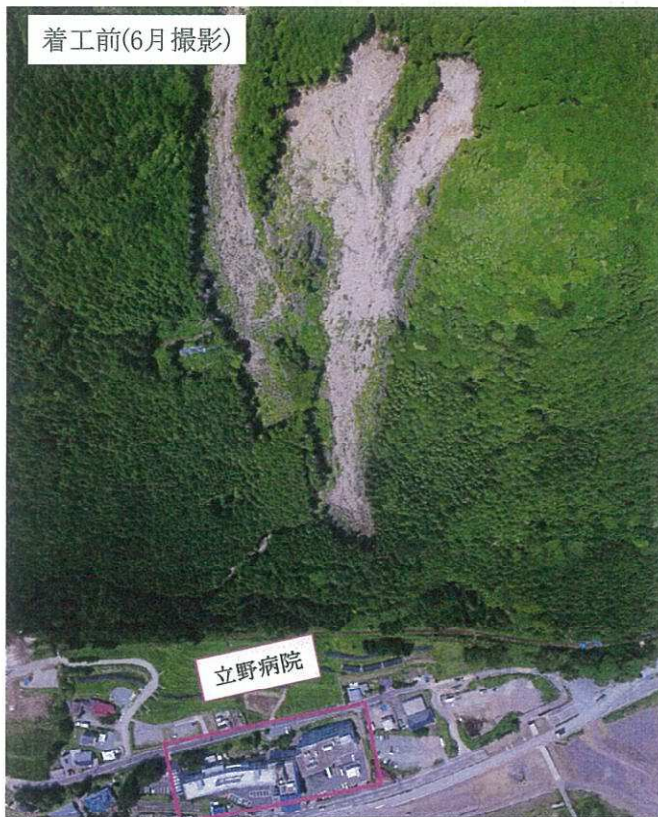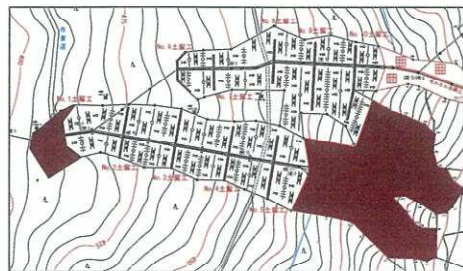

進捗状況(12月25日撮影)
